Reporte del sistema de monitoreo al 31 de octubre 2026

Perú



Andes Resilientes al Cambio Climático
Fase 2

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Embajada de Suiza en el Perú

Cooperación Internacional - COSUDE
Hub Regional Lima

HELVETAS

Fundación Avina

Contenido

1 **Láminas del módulo de seguimiento**

2 Láminas del módulo de monitoreo

3 Gráfico de brechas

3 Aportes de contraparte

Andes Resilientes
al Cambio Climático


Centro de seguimiento técnico-financiero


Perú

Andes Resilientes al Cambio Climático Fase 2


centro de seguimiento a la ejecución tecnico - financiera





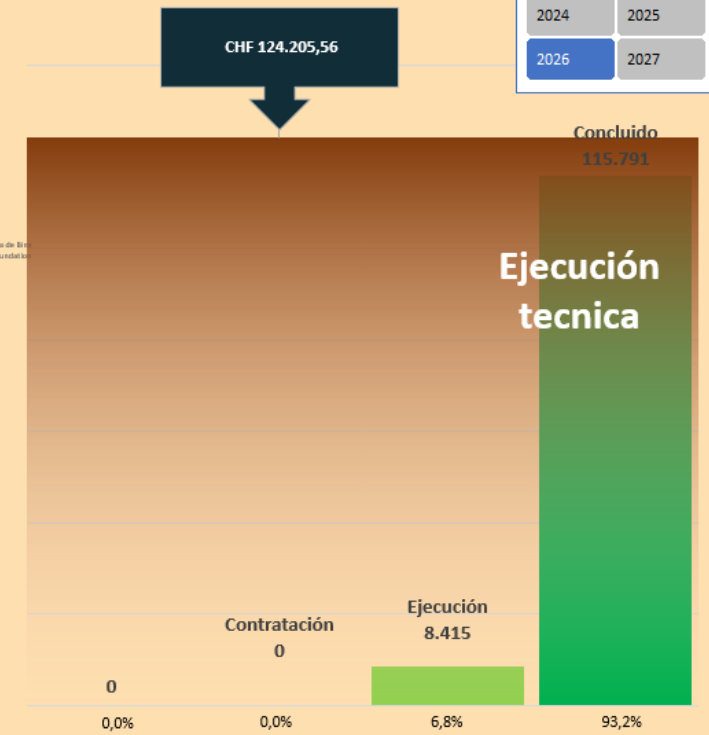


Distribución de iniciativas por socios

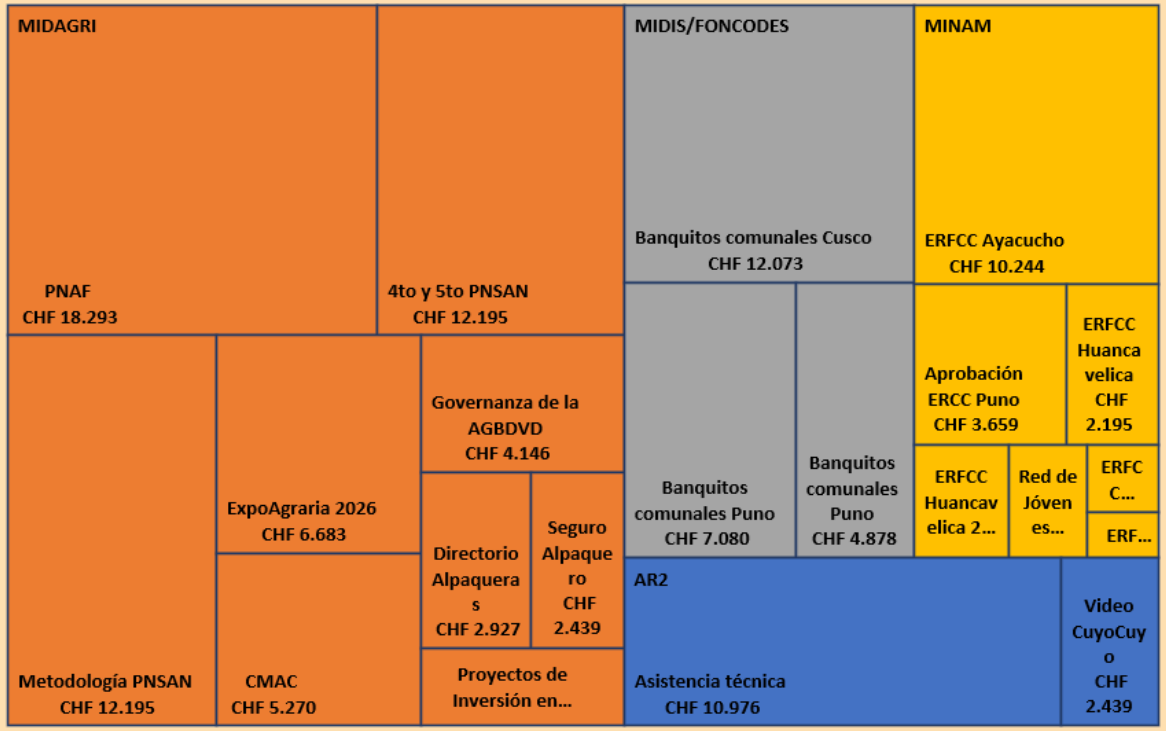

Estado de las iniciativas

# de iniciativas por ser iniciadas:	0
# de iniciativas en contratación:	0
# de iniciativas en ejecución:	3
# de iniciativas concluidas:	20

Cuadro de seguimiento a actividades POA 2026 - Perú

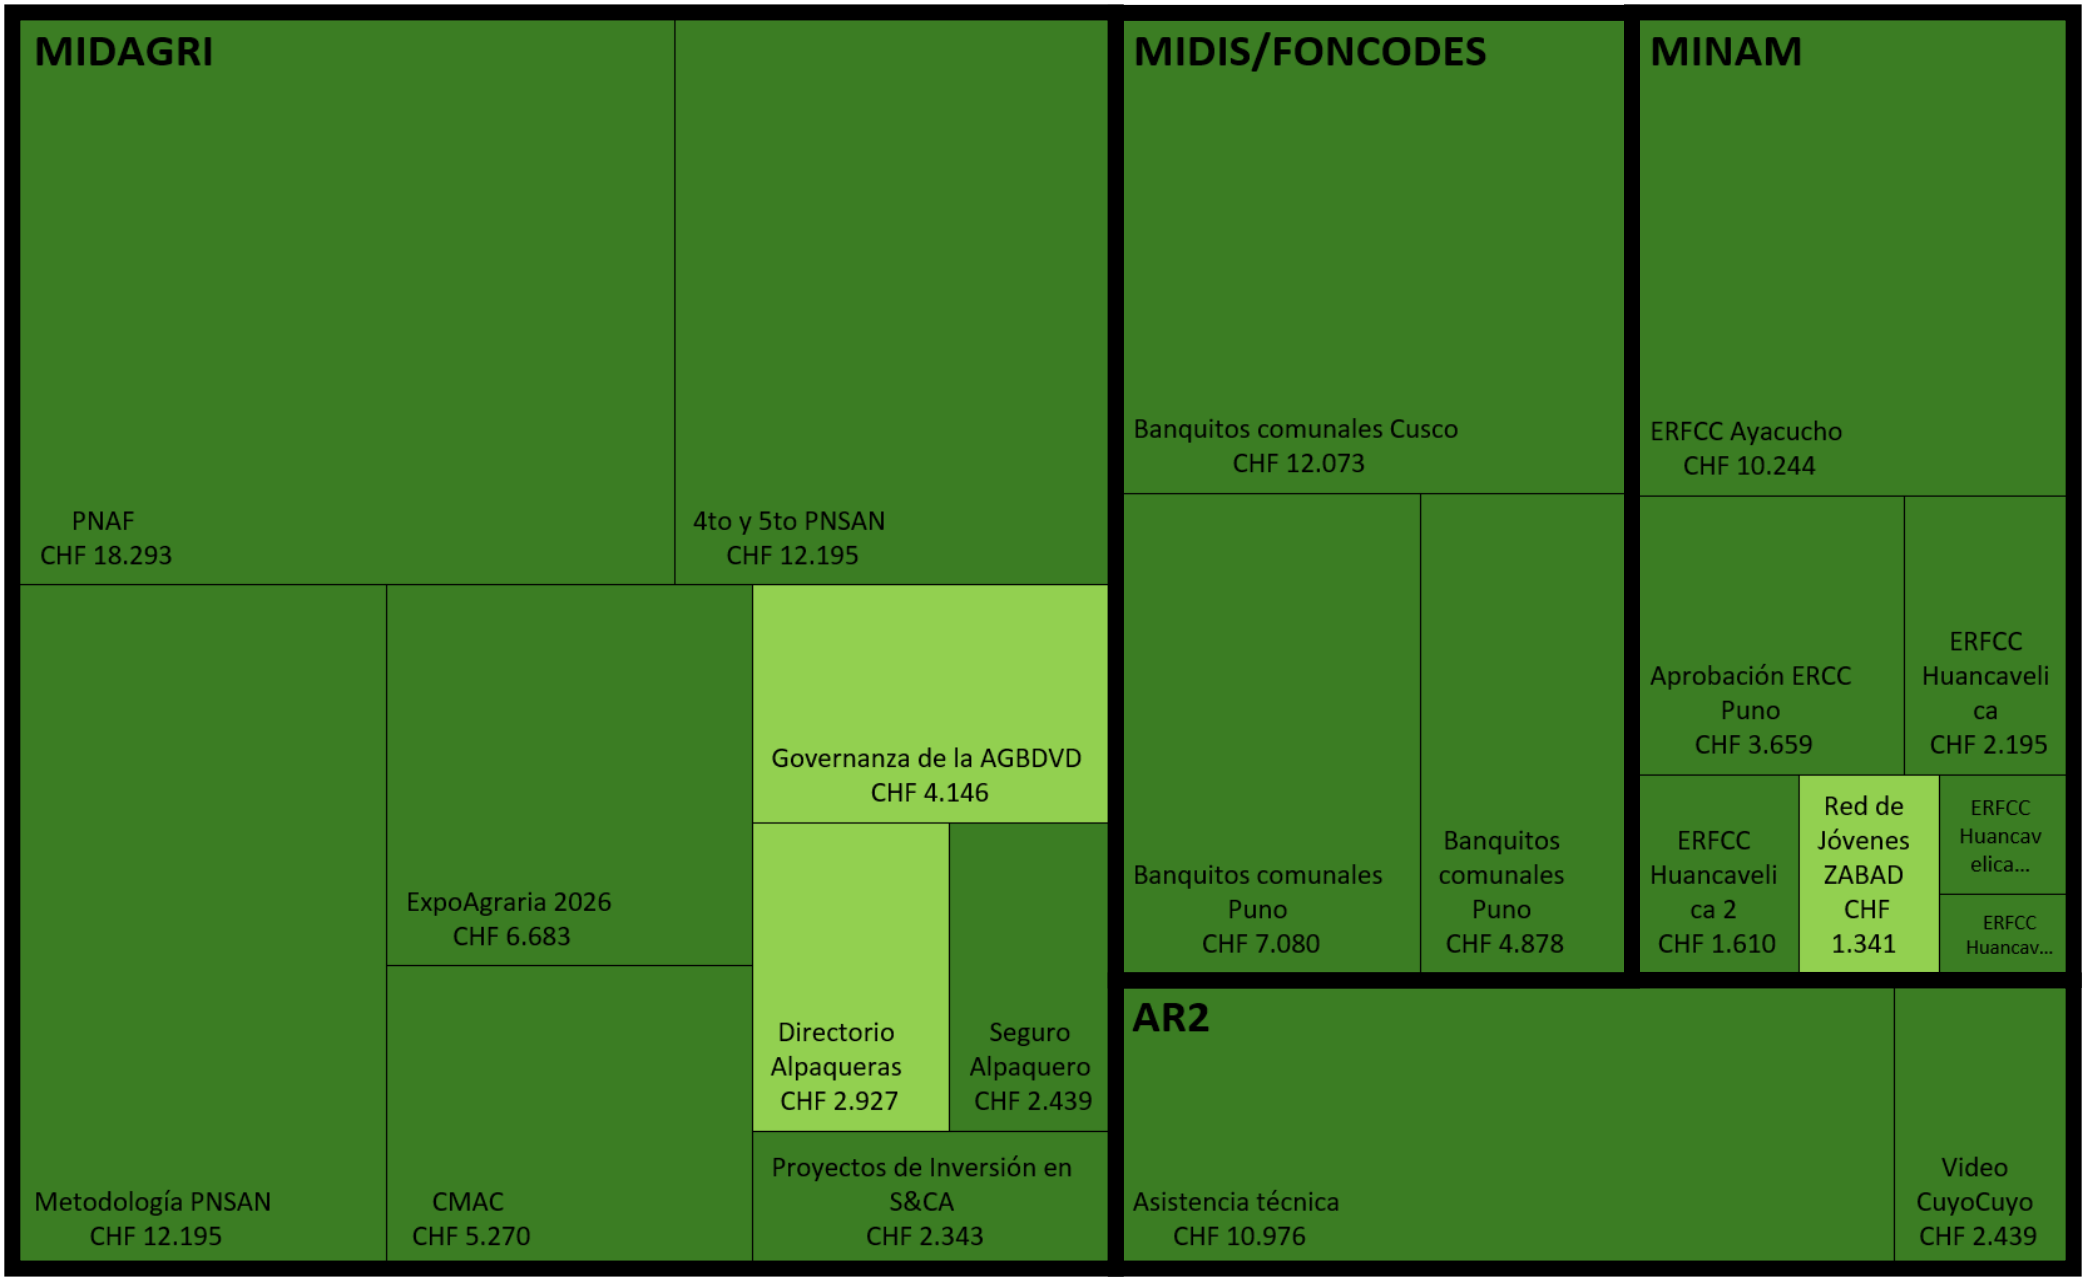

Actividades en espera de ser iniciadas

Actividades en proceso de contratación

Actividades en ejecución


Actividades concluidas

Andes Resilientes al Cambio Climático

Iniciativas por el producto presupuestal y por su aporte a la resiliencia de la AFA


Perú



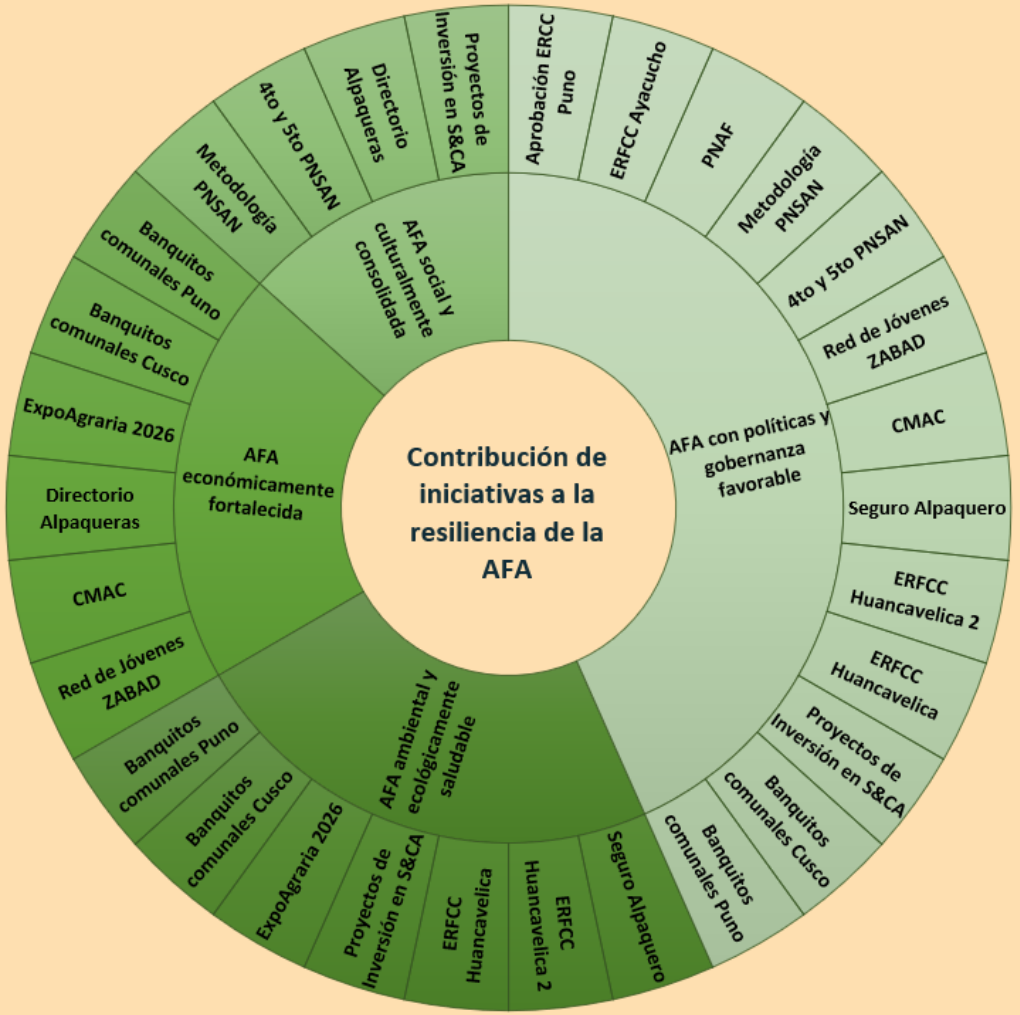

Iniciativas por su aporte a temas transversales

Perú

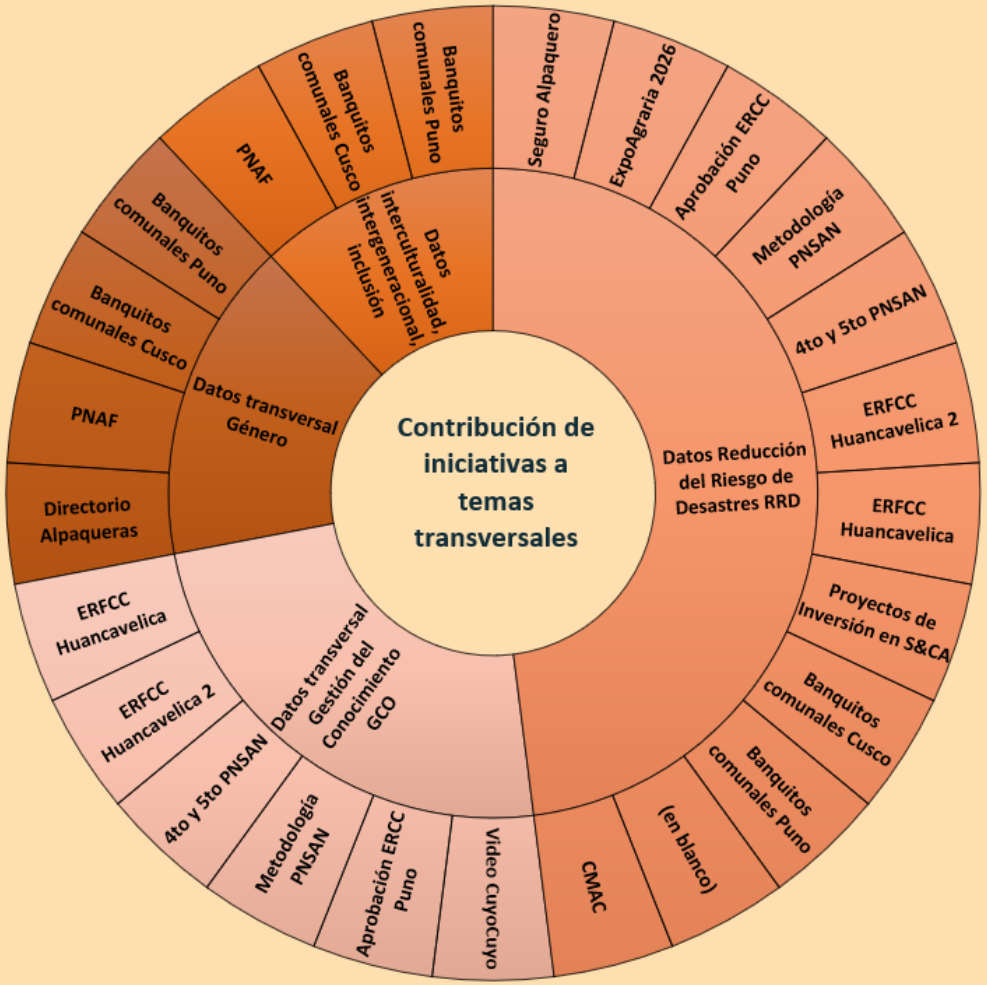

Contenido

1 Láminas del módulo de seguimiento

2 **Láminas del módulo de monitoreo**


3 Gráfico de brechas

3 Aportes de contraparte

Andes Resilientes
al Cambio Climático


Centro de monitoreo consolidado

Perú

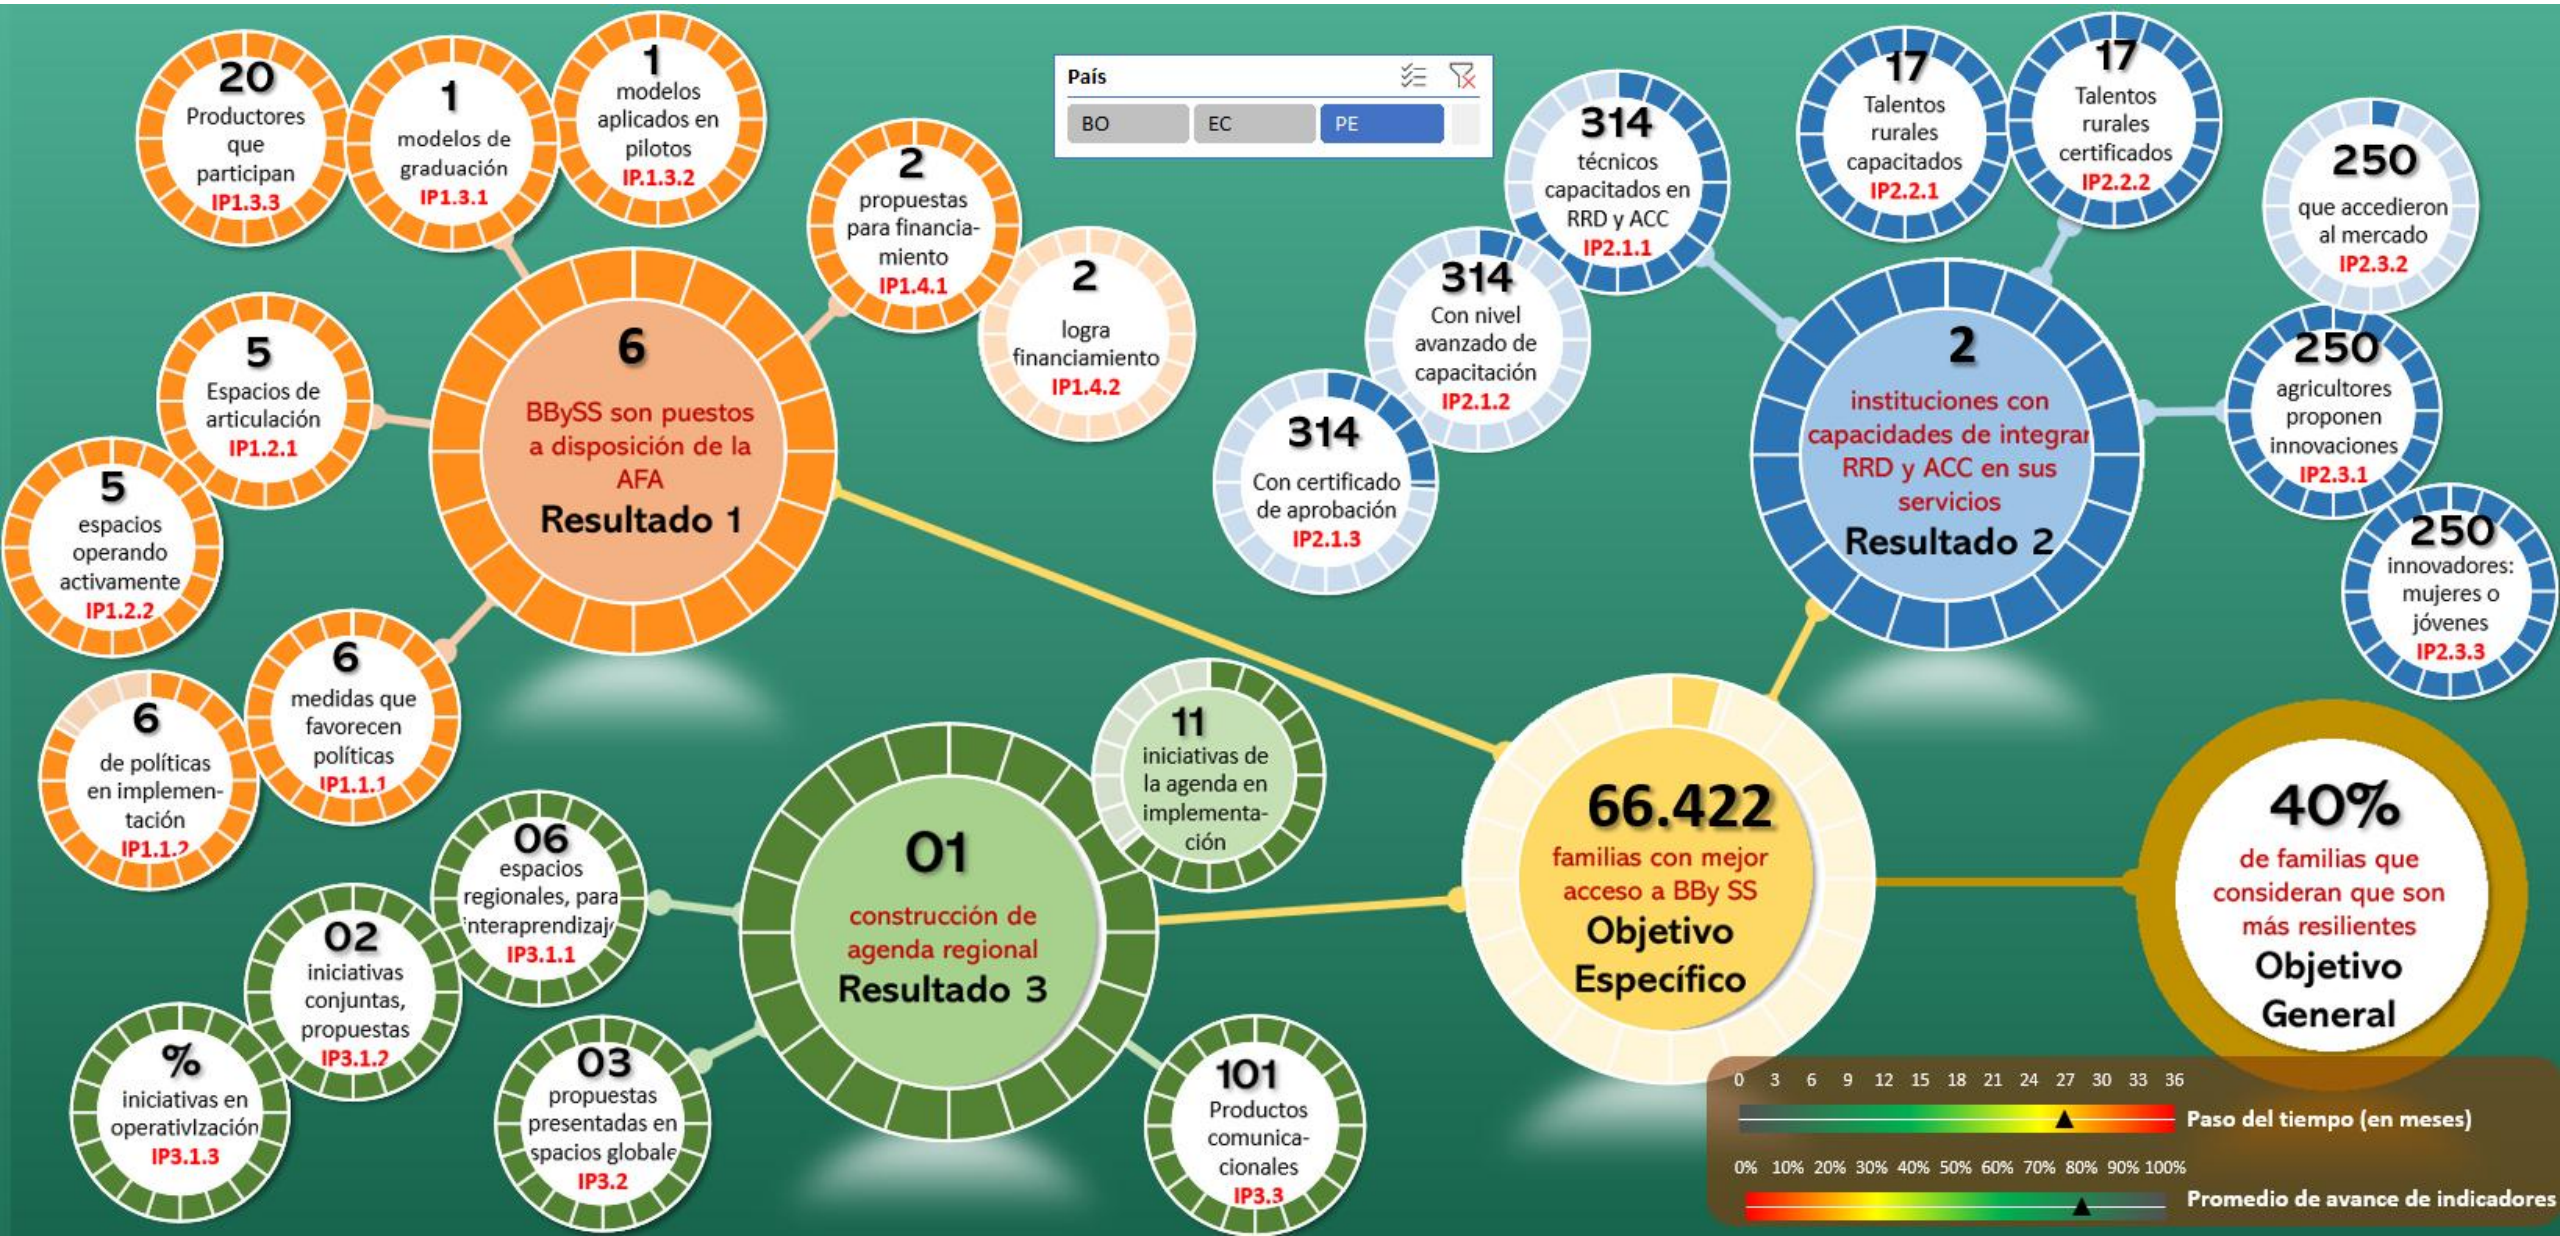


Avance en los indicadores del producto: 1.1

Perú

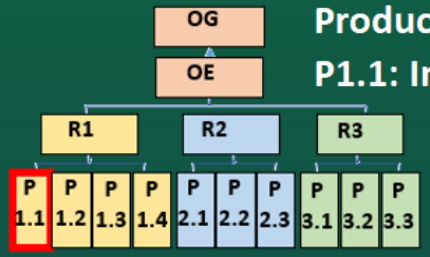

Producto:

P1.1: Implementación territorial de medidas de política, en acción articulada entre gobiernos nacional y subnacionales



		METAS			
Indicador	**Meta Explicada**	**Total**	**Bolivia**	**Ecuador**	**Perú**
IP1.1.1	16 medidas de política aprobadas en su contenido	16	5	5	6
IP1.1.2	% de 16, que fueron aprobadas para su aplicación	100%	100%	100%	100%

IP1.1.1: No de medidas/iniciativas, que favorecen la generación y/o operativización de políticas

Perú

Meta: 6

Logrado: 7



IP1.1.2: % políticas apoyadas en Fase 1 y en Fase 2, en proceso de implementación

Perú

Meta: 6


Logrado: 5




Tipo	Título de la medida de política	Estado	Código
Plan	Plan de Gestión de la Zona de Agrobiodiversidad Chacoche en Apurímac	Aprobado para su	PE-2025-33.3
Guía	Actualización de la guía para la elaboración de los PARNDC del sector agrario	En elaboración	PE-2025-07.1
Instrumento de política	Monitoreo y Evaluación (M&E) del PARNDC del sector agrario del GORE Puno	En aplicación	PE-2025-01.2
Instrumento de política	Plan de Gestión de la zona de agrobiodiversidad Parque de la papa	Concluido	PE-2025-04.1
Instrumento de política	Actualización de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático de la región Huancavelica	En aplicación	PE-2025-08.5
Instrumento de política	Actualización del indicador de brecha "Porcentaje de superficie sin acondicionamiento para recarga hídrica proveniente de precipitación"	Concluido	PE-2025-13.1
Instrumento de política	Actualización de los lineamientos para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de la tipología de siembra y cosecha de agua	Concluido	PE-2025-13.2
Instrumento de política	Estrategia Regional Frente al Cambio Climático Cusco 2050	En aplicación	PE-2025-27.1
Instrumento de política	Actualización de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático de la región Puno 2025-2034	En aplicación	PE-2025-01.1
Instrumento de política	Entregable 2 del proceso de actualización de la Política Nacional de Agricultura Familiar PNAF	Aprobado en su elaboración	PE-2026-03.2
Instrumento de política	Estrategia Regional Frente al Cambio Climático de la región Ayacucho	Aprobado en su elaboración	PE-2026-04.3
Instrumento de política	Diseño, desarrollo y validación metodológica del módulo de camélidos del Padrón de Productores Agrarios (PPA) del Seguro Alpaquero Paramétrico	Concluido	PE-2026-14.2
Política	Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional	Concluido	PE-2026-06.3
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Avance en los indicadores del producto: 1.2

Perú

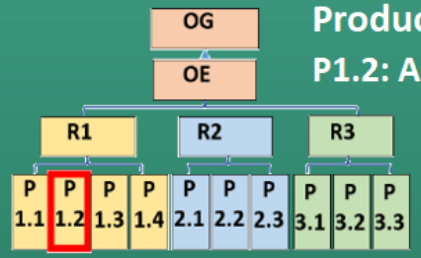



Producto:

P1.2: Articulación intersectorial y territorial para la provisión de servicios públicos y privados dirigidos a la resiliencia climática de la AFA

		METAS			
Indicador	**Meta Explicada**	**Total**	**Bolivia**	**Ecuador**	**Perú**
IP1.2.1	11 espacios de articulación intersectorial promovidos	11	2	4	5
IP1.2.2	% de 11, operando (con reuniones de al menos dos sectores)	100%	100%	100%	100%

IP1.2.1: No de espacios de articulación entre actores, sectores y/o niveles de gobierno, apoyados o promovidos

Perú

Meta: 5

Logrado: 8



IP1.2.2: % de los espacios de articulación, operando activamente

Perú

Meta: 5


Logrado: 7




Tipo	Nombre del especio de articulación	Estado	Rol de AR2	Código
Grupo	Grupo Técnico Interinstitucional ERFCC Huancavelica	Operando	Articulador/conformador	PE-2025-08.1
Grupo	Equipo Tecnico de la ERFCC - Puno	Operando	Apoyo técnico	PE-2025-01.1
Grupo	Grupo Técnico Interinstitucional ERFCC Cusco	Operando	Articulador/conformador	PE-2025-27.1
Plataforma	Plataforma de Pueblo Indígenas para enfrentar el Cambio Climático (PPICC)	Operando		PE-2025-02.2
Plataforma	Articulación territorial regional para la acción climática en el sector agrario en el marco de los CGBA	Operando		PE-2025-07.2
Festival	ExpoAgraria 2026	Objetivo concluido		PE-2026-19.1
Comisión	Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional COMSAN	Operando		PE-2025-06.1
Comisión	Comisión del Sector Agrario y de Riego sobre Cambio Climático	Operando		PE-2026-13.1

Avance en los indicadores del producto: 1.3

Perú

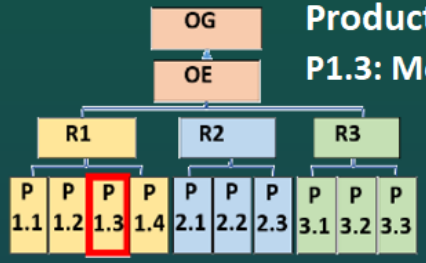



Producto:

P1.3: Modelo de graduación de emprendimientos rurales sostenibles a cargo de unidades económicas de la AFA operando en territorios piloto

		METAS			
Indicador	**Meta Explicada**	**Total**	**Bolivia**	**Ecuador**	**Perú**
IP1.3.1	3 modelos de graduación aprobados por el socio correspondiente	3	1	1	1
IP1.3.2	% de 3 modelos, que son aplicados en pilotos	100%	100%	100%	100%
IP1.3.3	60 productores que participan de los pilotos	60	20	20	20

Entidad	**Nombre del modelo de graduación**	**Estado**	**Nombre del Piloto**	**# Mujeres**	**#Varones**	**Codigo**
FONCODES	Escuelas de Campo (ECA) para emprendimientos rurales inclusivos, considerando el enfoque de adaptación frente al cambio climático	Aprobado	(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)	PE-2025-10.3
FONCODES	Bancos Comunales Resilientes - Puno	En aplicación	Puno	277	180	PE-2025-12.8
FONCODES	Bancos Comunales Resilientes - Cusco	En aplicación	Cusco	220	156	PE-2025-22.8
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

IP1.3.1: No de modelos de graduación, aprobados

Perú

Meta: 1

Logrado: 3



IP1.3.2: % de los modelos de graduación, aplicados en experiencias piloto

Perú

Meta: 1

Logrado: 2



IP1.3.3: No de productores, que participan en los pilotos de graduación

Perú


Meta: 20

Logrado: 833




Avance en los indicadores del producto: 1.4

Perú

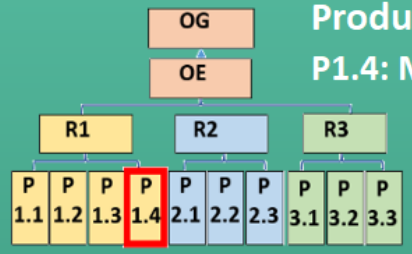

Producto:

P1.4: Mejora del financiamiento público, privado y de cooperación internacional para medidas de ACC que favorecen la resiliencia de la AFA



		METAS			
Indicador	**Meta Explicada**	**Total**	**Bolivia**	**Ecuador**	**Perú**
IP1.4.1	5 propuestas para medidas ACC	5	2	1	2
IP1.4.2	% de 5, propuestas aceptadas por el financiador	100%	100%	100%	100%

IP1.4.1: No de propuestas elaboradas, para acceder a financiamiento para medidas ACC

Perú

Meta: 2

Logrado: 3



IP1.4.2: % de propuestas que acceden a financiamiento público, privado o de la cooperación internacional

Perú

Meta: 2


Logrado: 0




Tipo	Titulo de la propuesta para financiamiento	Estado	Financiador	Monto (CHF	Codigo
Nota conceptual	Propuesta de la CNA-Perú a convocatoria para Concesión de subvenciones en la región montañosa andina: Pérdidas y daños no económicos	Presentada	CJRF - Fondo de Resiliencia	34.009,00	PE-2025-25.1
Consultoría	Propuesta AR2 a GIZ PROResiliente para "Sistematización de la información existente sobre vulnerabilidad y riesgos climáticos relevante para el Proyecto	Presentada	GIZ - Puna Resiliente	18.615,00	PE-2025-26.1
Proyecto	NOS finance: The financial layer for invisible economies	Presentada	WFP - World Food	90.090,00	PE-2026-32.1
0		0	0	0,00	0
0		0	0	0,00	0
0		0	0	0,00	0
0		0	0	0,00	0
0		0	0	0,00	0
0		0	0	0,00	0
0		0	0	0,00	0
0		0	0	0,00	0

Avance en los indicadores del producto: 2.1

Perú

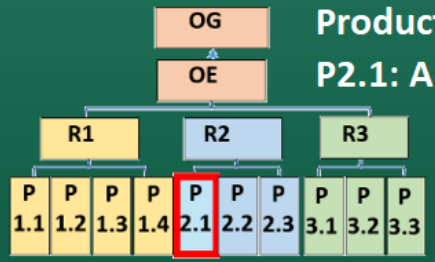



Producto:

P2.1: Actores públicos y privados proveedores de BBySS para la AFA fortalecen sus capacidades para integrar la ACC en sus servicios

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP2.1.1	604 técnicos con capacitación básica de RRD y ACC	604	146	144	314
IP2.1.2	100% de 604 técnicos con capacitación avanzada de RRD y ACC	100%	100%	100%	100%
IP2.1.3	% de 604 técnicos que han concluido y aprobado la capacitación	100%	100%	100%	100%

IP2.1.1: No de técnicos (agricultores, funcionarios, especialistas, de la academia y otros proveedores de servicios), capacitados en RRD y ACC

Perú
Meta: 314
Logrado: 219



IP2.1.2: % de técnicos (agricultores,funcionarios, especialistas, de la academia y otros proveedores de servicios), que han profundizado sus conocimientos para la integración de la RRD y ACC

Perú
Meta: 314
Logrado: 22



IP2.1.3: % de técnicos capacitados con certificado de aprobación


Perú
Meta: 314
Logrado: 82



Evento	Evento de capacitación	Estado	Nivel	# asistentes	# aprobados	Codigo
Taller	Capacitación sobre el producto financiero "Credi microreservorio" de siembre y cocecha de agua	Concluida	Basico	56	42	PE-2025-03.3
Taller	Taller de capacitación: Formulación y evaluación de proyectos de inversión de la tipología de Siembra y Cosecha de Agua	Concluida	Basico	100	0	PE-2025-29.1
Taller	Productos financieros hacia la adaptación al cambio climático; Crédito para la compra de bombas solares	Concluida	Basico	9	0	PE-2025-23.3
Curso	Programade formación regional en Adaptación, resiliencia y diplomacia climática tranformadora	Concluida	Avanzado	22	16	PE-2025-03.1
Curso	Certificación evaluadores de Competencias Laborales de los Yachachiq de los Proyectos de Desarrollo Productivos MTPE y FONCODES	Concluida	Basico	32	24	PE-2025-19.1


Avance en los indicadores del producto: 2.2

Perú

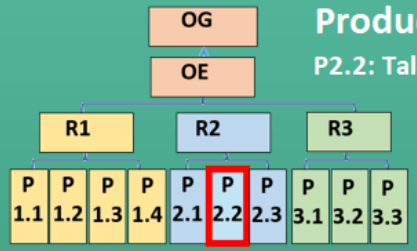

Producto:

P2.2: Talentos rurales son certificados por entidades competentes reconociendo sus conocimientos y capacidades para prestar asistencia técnica sobre prácticas agropecuarias resilientes al



Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP2.2.1	60 talentos rurales que participan de eventos de fortalecimiento de capacidades	60	17	26	17
IP2.2.2	% de 60, talentos rurales que logran certificación por entidad competente	100%	100%	100%	100%

IP2.2.1: No de talentos rurales que, fortalecen sus capacidades

Perú

Meta: 17

Logrado: 226



IP2.2.2: % de talentos rurales que, reciben certificación de sus capacidades por entidades competentes

Perú

Meta: 17


Logrado: 144




Promotor	Título de la certificación o estándar	Estado	# Fortalecidos	# Certificados	Código
FONCODES	Escuelas de Campo para emprendimientos rurales inclusivos	En planificación			PE-2025-10.2
FONCODES	Certificación de Competencias Laborales de los Yachachiq de los Proyectos de Desarrollo Productivos	Concluido	108	108	PE-2025-19.2
FONCODES	Certificación de Evaluadores de los Yachachiq	Concluido	32	32	PE-2025-19.1
Ministerio de Trabajo y	Evaluadores de competencias del procesamiento Primario de Fibra de Alpaca	Concluido	7	4	PE-2025-18.1
ASOMIF Perú	Capacitación en Financiamiento Verde: Credi Bomba Solar	(en blanco)	39		PE-2025-23.3
Sin certificación	Gestión de los bancos comunales y préstamo de semillas	Concluido	40		PE-2025-20.3
MIDAGRI	Transformación primaria de fibra de alpaca	Ejecución			PE-2026-31.3
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Avance en los indicadores del producto: 2.3

Perú

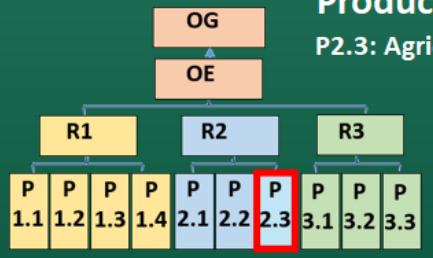



Producto:

P2.3: Agricultores, en especial mujeres y jóvenes, desarrollan y difunden prácticas innovadoras para mejorar la resiliencia climática de la AFA, mejorando también acceso al mercado

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP2.3.1	600 agricultores con propuestas/herramientas/practicas innovadoras que mejoran la productividad y resiliencia de la AFA	600	200	150	250
IP2.3.2	100% de 600 Agricultores que lograron transacciones comerciales con productos de sus innovaciones	100%	100%	100%	100%
IP2.3.3	% de 600 agricultores innovadores que son mujeres y/o jóvenes	100%	100%	100%	100%

IP2.3.1: No de agricultores andinos que, desarrollan, proponen y/o difunden practicas innovadoras

Perú
Meta: 250
Logrado: 771



IP2.3.2: % de agricultores, que realizaron transacciones comerciales con productos de estas innovaciones

Perú
Meta: 250
Logrado: 12



IP2.3.3: % de agricultores innovadores, mujeres y/o jóvenes


Perú
Meta: 250
Logrado: 433




Tipo	Nombre / Título del evento	Promotor	# innovadores	# Mujeres	# Jóvenes	# Innovadores con transacciones	Codigo
Convocatoria	Evaluadores de la Norma de Competencias sobre categorización y clasificación de fibra de alpaca	AGROMERCADO	7	7			PE-2025-18.1
Feria	Lima Teje	DGDC - MIDAGRI					PE-2025-10.6
Feria	ExpoAgraria 2026	MIDAGRI	12	12		12	PE-2026-19.1
Prácticas Innovadoras	Crédito para la compra de Bombas Solares	ASOMIF	39	30			PE-2025-23.3
Prácticas Innovadoras	Desarrollo de capacidades en los Talentos Rurales Financieros de Cusco para garantizar la continuidad y sostenibilidad de los bancos comunales	FONCODES	220	156			PE-2025-22.2
Prácticas Innovadoras	Certificación de Competencias Laborales de los Yachachiq de los Proyectos de Desarrollo Productivos	FONCODES	108	24			PE-2025-19.1
Prácticas Innovadoras	Certificación de Competencias Laborales de los Yachachiq de los Proyectos de Desarrollo Productivos	FONCODES	108	24			PE-2025-19.2
Prácticas Innovadoras	Desarrollo de capacidades en los Talentos Rurales Financieros de Puno para garantizar la continuidad y sostenibilidad de los bancos comunales	FONCODES	277	180			PE-2025-12.2
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Avance en los indicadores del resultado: 1

Perú

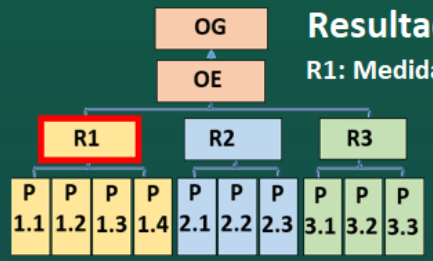



Resultado:

R1: Medidas de política que favorecen la resiliencia climática de la AFA, se institucionalizan e implementan, poniendo a disposición BBySS para los agricultores andinos

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IR1	16 BBySS para la resiliencia de la AFA con apoyo de iniciativas de las Fases 1 o 2	16	5	5	6

IR1: No de BBySS nacionales y/o locales para mejora de la resiliencia a los riesgos climáticos, puestos a disposición de la AFA

Perú

Meta: 6


Logrado: 8



Tipo	Nombre del Bien o Servicio para la AFA	Entidad	Alcance	Estado	Codigo
Ahorro	Bancos comunales resilientes para la agricultura familiar andina y sus emprendimientos en Cusco	FONCODES	subnacional	En funcionamien	PE-2025-22.2
Desarrollo de	Microcursos con enfoque agroecológico vía Whatsapp	MUSA-UTEC	subnacional	En funcionamien	PE-2026-20.1
Micro credito	Bancos comunales resilientes para la agricultura familiar andina y sus emprendimientos en Puno	FONCODES	subnacional	En funcionamien	PE-2025-12.2
Micro credito	Producto financiero para la construcción de micro reservorios para la cosecha de agua	Federación Peruana de Cajas	subnacional	En funcionamien	PE-2025-03.3
Micro credito	Financiamiento Verde: Credi Bomba Solar	ASOMIF	Nacional	En funcionamien	PE-2025-23.3
Certificación de	Certificación de competencias laborales de talentos rurales para la adaptación al cambio climático de la AFA (Yachachiq)	FONCODES	Nacional	En funcionamien	PE-2025-19.2
Certificación de	Evaluadores de competencias del procesamiento Primario de Fibra de Alpaca	MIDAGRI	subnacional	En funcionamien	PE-2025-18.1
Certificación de	Certificación de evaluadores para la certificación de talentos rurales para la adaptación al cambio climático de la AFA (Yachachiq)	FONCODES	Nacional	En funcionamien	PE-2025-19.1
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Avance en los indicadores del resultado: 2

Perú

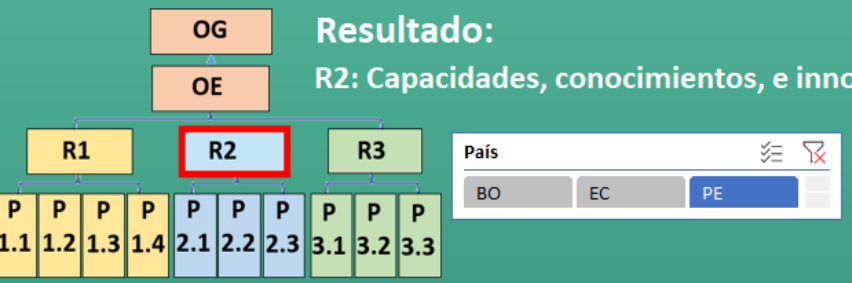

Resultado:

R2: Capacidades, conocimientos, e innovaciones desarrolladas por los actores vinculados a la AFA, mejoran y/o fortalecen los servicios para la resiliencia climática

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IR2	52 instituciones fortalecidas por el proyecto que integran RRD y ACC en sus servicios	52	10	20	22

IR2: No de instituciones proveedoras de servicios para la AFA, que integran RRD y ACC en sus servicios

Perú

Meta: 22

Logrado: 23



Sigla	Proceso de fortalecimiento	Tipo	Nombre	Estado	Código
CNA	Fortalecimiento de conocimientos a la CNA y/o sus bases regionales sobre la temática de cambio climático y las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional	Confederación	Confederación Nacional Agraria	Concluido	PE-2025-02.1
FONCODES	Brindar asistencia técnica a FONCODES y en los Núcleos Ejecutores (NE) que financia en territorios andinos de Puno, al establecimiento y funcionamiento de bancos comunales resilientes bajo la metodología de Fondos Revolventes	Gobierno Nacional	Fondo de Cooperación para el	Concluido	PE-2025-12.2
INIA	Apoyo en la ealización de un side event sobre la conservación in situ de la agrobiodiversidad en la COP16 de la Convención de Diversidad Biológica, realizado en noviembre en Colombia, y dentro del pabellón Perú en la COP	Gobierno Nacional	Instituto Nacional de Innovación	Concluido	PE-2024-01.1
INIA	Elaboración del Plan de Gestión de la Zona de Agrobiodiversidad Parque de la Papa, situada en el distrito de Pisac, provincia Calca, región Cusco	Gobierno Nacional	Instituto Nacional de Innovación	Concluido	PE-2025-04.1
DGCCD - MINAM	Actualmente se cuenta con una versión preliminar de la Comunicación Nacional de Adaptación del Perú, la cual requiere complementar y actualizar las secciones específicas y la integración de insumos técnicos adicionales, siguiendo el esquema de	Gobierno Nacional	Dirección General de Cambio	Concluido	PE-2025-30.1
DGCCD - MINAM	Diseñar, construir e implementar una herramienta ofimática y web service para el registro, consulta y reporte de acciones, iniciativas y/o proyectos de adaptación al cambio climático por parte del sector privado	Gobierno Nacional	Dirección General de Cambio	Concluido	PE-2025-31.2
FONCODES	Talleres para la formación y autorización de evaluadores en las sedes de Cusco y Huancayo en el Estándar de Competencia Laboral de "Fortalecer las capacidades del usuario en el sistema de producción familiar, mejora de vivienda productiva y gestión	Gobierno Nacional	Fondo de Cooperación para el	Concluido	PE-2025-19.1
DGAAA - MIDAGRI	Actualización de la guía para la elaboración del Plan de Acción Regional para la implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (PARNDC) del sector agrario y diseño de un modelo de articulación territorial regional para la acción	Gobierno Nacional	Dirección General de Asuntos	Concluido	PE-2025-07.2
DEIA - MIDAGRI	Brindar asistencia técnica especializada a la Dirección de Estadística e Información Agraria (DEIA) para el diseño, desarrollo y validación metodológica del Módulo de Camélidos del Padrón de Productores Agrarios (PPA), incorporando variables productivas	Gobierno Nacional	Dirección de Estadística e Información	Concluido	PE-2026-14.2
AGROMERCADO	Apoyo técnico logístico para la organización y desarrollo del taller de evaluadores de la Norma de Competencias sobre categorización y clasificación de fibra de alpaca de junio de 2025	Gobierno Nacional	AGROMERCADO - MIDAGRI	Concluido	PE-2025-18.1
IGP	Apoyo para lograr articulación con los gobierno regionales en la operativización de las Estrategias Regionales Frente al Cambio Climático	Gobierno Nacional	Instituto Geofísico del Perú	Concluido	PE-2026-08.2
GRDA - GORE Puno	Asistencia técnica en el seguimiento, evaluación y reporte anual del Plan de Acción Regional para la implementación de las NDC del sector agrario Puno (PARNDC) al 2027	Gobierno Subnacional	Gerencia Regional de Desarrollo	Concluido	PE-2025-01.2
GORE Huancavelica	Actualización de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático (ERCC) de Huancavelica, priorizando las áreas temáticas de Agua y Agricultura, de manera	Gobierno Subnacional	Gobierno Regional de Huancavelica	Concluido	PE-2025-08.5
GORE Puno	Asistencia técnica y facilitación en la culminación de la actualización de la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) de Puno	Gobierno Subnacional	Gobierno Regional de Puno	Concluido	PE-2025-01.1
	Durante la fase se apoyó en la actualización de la Estratégia Regional Frente al Cambio	Gobierno	Gobierno		

Avance en los indicadores del resultado: 2 (segunda parte)


Perú


		Subnacional	Puno	Concluido	PE-2025-01.1
GORE Cusco	Durante la fase se apoyó en la actualización de la Estratégia Regional Frente al Cambio Climático, apoyo que continuó en la fase 2 con su promulgación y lanzamiento	Gobierno Subnacional	Gobierno Regional de Cusco	Concluido	PE-2025-27.1
GORE Ayacucho	Fortalecimiento de capacidades del Equipo Técnico conformado para la actualización de la ERCC Ayacucho, hasta la conformidad técnica de la ERCC actualizada por parte de dicho equipo y el ente rector	Gobierno Subnacional	Gobierno Regional de Ayacucho	Concluido	PE-2026-04.3
ASOMIF Perú	Desarrollo de materiales y Taller de capacitación dirigido a analistas financieros orientado a fortalecer capacidades técnicas y estratégicas en la evaluación crediticia de un crédito cuyo destino es el financiamiento de kits de bombeo de agua con energía	No publico	Asociación de Instituciones de	Concluido	PE-2025-23.1
WCS	Aportar a la conservación de la agrobiodiversidad en el Perú como un mecanismo de resiliencia de los productores de la Agricultura Familiar Andina (AFA) frente a los impactos del cambio climático	No publico	Wildlife Conservation Society	Concluido	PE-2025-20.4
CMAC Huancayo, Cusco e Ica	Organización e implementación de asesoría sobre el producto "Credi Microreservorio" a CMAC Arequipa	No publico	Caja Municipal de Ahorro y Crédito de	Concluido	PE-2025-03.3
ECOS	Articulación para la actualización de la ERCC Ayacucho	No publico	Fundación ECOS	Concluido	PE-2026-04.2
MUSA	Desarrollo de microcursos de desarrollo de capacidades via Whatsapp en apoyo a la certificación de los talentos rurales Yachachiq	No publico	MUSA	Concluido	PE-2025-19.2
PPICC	Impulsar el logro de los objetivos de la PPICC para enfrentar el cambio climático, a través de la sistematización de propuestas de medidas de adaptación de los pueblos indígenas u originarios, así como los conocimientos, prácticas y saberes tradicionales y	Plataforma	Plataforma de Pueblo Indígenas para	Concluido	PE-2025-02.2
Caja Los Andes	Fortalecimiento de capacidades a los asesores de negocios, mediante talleres, en torno al producto Credi Bomba Solar	Privado	Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes S.A.	Concluido	PE-2025-23.2
NOS	En colaboración con los facilitadores en Cusco y Puno, NOS impactó en los banquitos comunales resilientes, combinando operación en campo y herramientas digitales para fortalecer organizaciones rurales y generar impacto medible	Privado	NOS Finance	Concluido	PE-2025-12.7
OPMI - MIDAGRI	Actualización del indicador de brecha de "Porcentaje de superficie sin acondicionamiento para recarga hídrica proveniente de precipitación" y mejorar los "Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión de la tipología de siembra	Programa	Oficina de Programación Multianual de	Concluido	PE-2025-13.1
Haku Wiñay - FONCODES	Diseño curricular y modular, plan de fortalecimiento de capacidades y la determinación de los materiales de extensión y capacitación, considerando la metodología de Escuelas de Campo para la consolidación y sostenibilidad de los Emprendimientos Rurales	Proyecto	Proyecto Haku Wiñay del Fondo de	Concluido	PE-2025-10.5
0	0	0		0	0
0	0	0		0	0
0	0	0		0	0
0	0	0		0	0
	0				

Avance en los indicadores del Objetivo Específico

Perú

Andes Resilientes al Cambio Climático

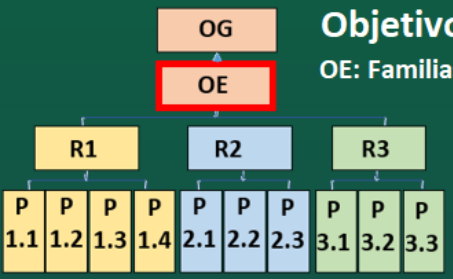



Objetivo Específico:

OE: Familias productoras de la AFA han mejorado su dotación y acceso a BBySS públicos / privados para mejorar la productividad y resiliencia climática de sus sistemas productivos y empren

		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IOE	185.277 familias de productores que acceden de mejor manera a BBySS	185.277	62.352	56.503	66.422

IOG: No de familias, con mejor acceso y dotación de BBySS

Perú

Meta: 66.422

Logrado: 2.693



		Beneficiarios directos		Beneficiarios indirectos	
Codigo	Proceso de fortalecimiento	Mujeres lider de hogar	Varones lider de hogar	Mujeres lider de hogar	Varones lider de hogar
PE-2025-29.1	Taller de capacitación: Formulación y evaluación de proyectos de inversión de la tipología de Siembra y Cosecha de Agua	50	50	0	0
PE-2025-03.1	Programade formación regional en Adaptación, resiliencia y diplomacia climática tranformadora	10	12	0	0
PE-2025-22.2	Desarrollo de capacidades en los Talentos Rurales Financieros de Cusco para garantizar la continuidad y sostenibilidad de los bancos comunales Bancos	156	156	162	76
PE-2025-20.3	Taller para la gestión de los bancos comunales y préstamo de semillas	27	13	0	0
PE-2025-03.3	Capacitación sobre el producto financiero "Credi microreservorio" de siembre y cocecha de agua Producto financiero para la construcción de micro	18	38	0	0
PE-2025-23.3	Productos financieros hacia la adaptación al cambio climático; Crédito para la compra de bombas solares Capacitación en productos financieros hacia la	62	46	0	0
PE-2025-12.2	Desarrollo de capacidades en los Talentos Rurales Financieros de Puno para garantizar la continuidad y sostenibilidad de los bancos comunales Bancos	180	180	194	117
PE-2026-20.1	Microcursos con enfoque agroecológico vía Whatsapp	0	0	0	0
PE-2025-18.1	Taller de capacitación para potenciales evaluadores de competencias laborales del perfil ocupacional: Procesamiento Primario de Fibra de Alpaca Evaluadores	13	8	0	0
PE-2025-19.1	Certificación evaluadores de Competencias Laborales de los Yachachiq de los Proyectos de Desarrollo Productivos MTPE y FONCODES Certificación de	44	68	0	0
PE-2025-19.2	Certificación de Competencias Laborales de los Yachachiq de los Proyectos de Desarrollo Productivos Certificación de Competencias Laborales de los	48	108	0	0
PE-2026-19.1	ExpoAgraria 2026	12	12	0	0
PE-2025-12.8	Bancos Comunales Resilientes - Puno	277	180	0	0
PE-2025-22.8	Bancos Comunales Resilientes - Cusco	220	156	0	0

Contenido

1 Láminas del módulo de seguimiento

2 Láminas del módulo de monitoreo


3 **Gráfico de brechas**

3 Aportes de contraparte

Andes Resilientes
al Cambio Climático

Gráfico de brechas en el logro de metas

Perú

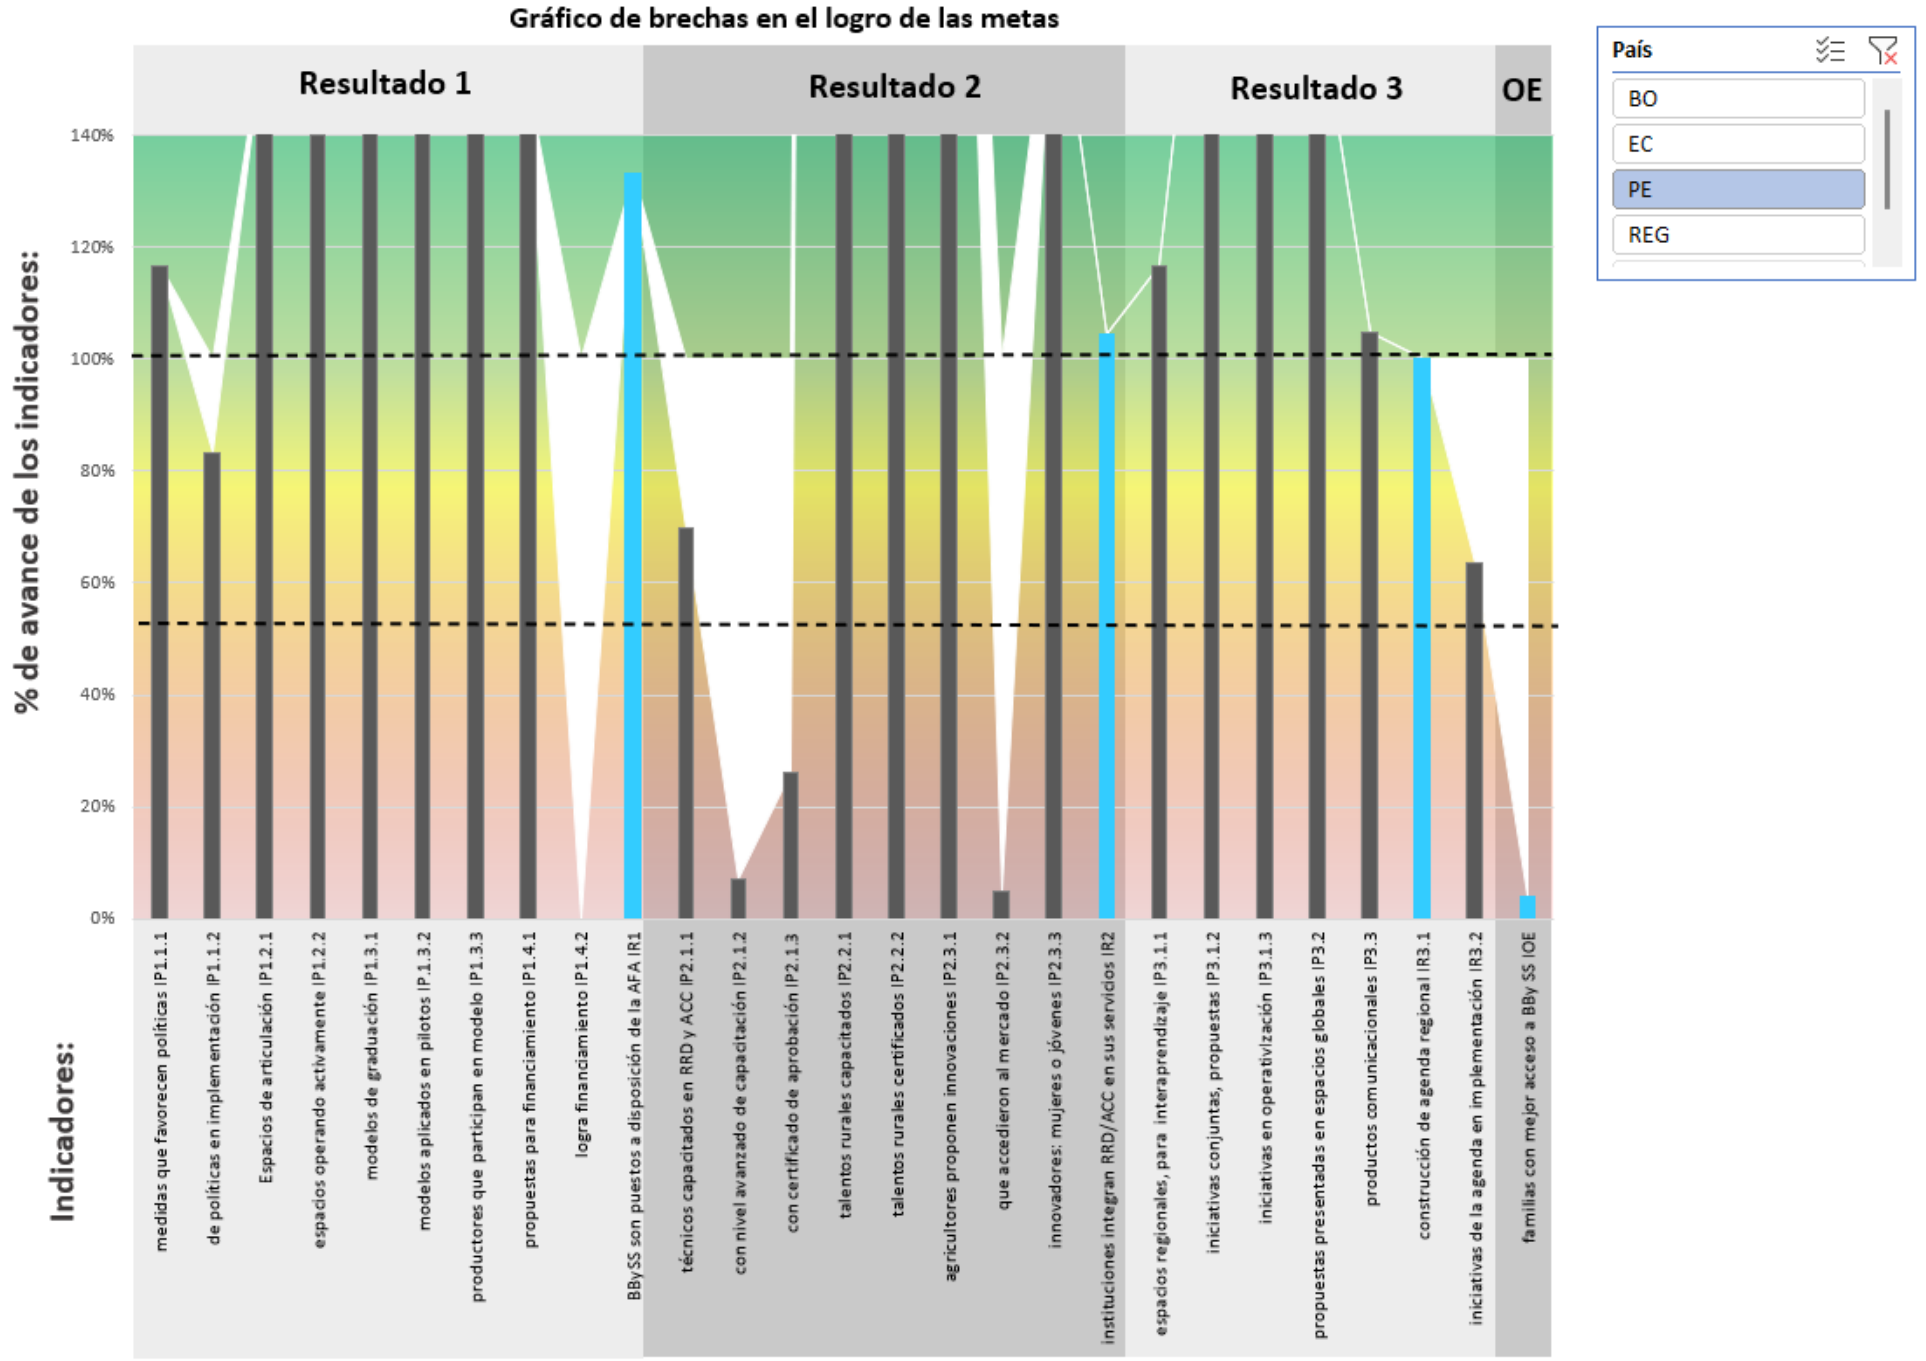

Contenido

1 Láminas del módulo de seguimiento

2 Láminas del módulo de monitoreo

3 Gráfico de brechas

3 **Aportes de contraparte**


Andes Resilientes
al Cambio Climático

Aportes de contrapartida de socios y aliados

Perú

Contrapartida consolidada (CHF)

Monto invertido por Andes Resilientes:	138.401
Monto total de contrapartida por socios:	148.208
en efectivo:	0
en tiempo de personal:	111.613
en matriales e insumo locales:	0
en matriales e insumo NO locales:	0
Otros aportes (ejem. gastos adminsitrativos):	36.594

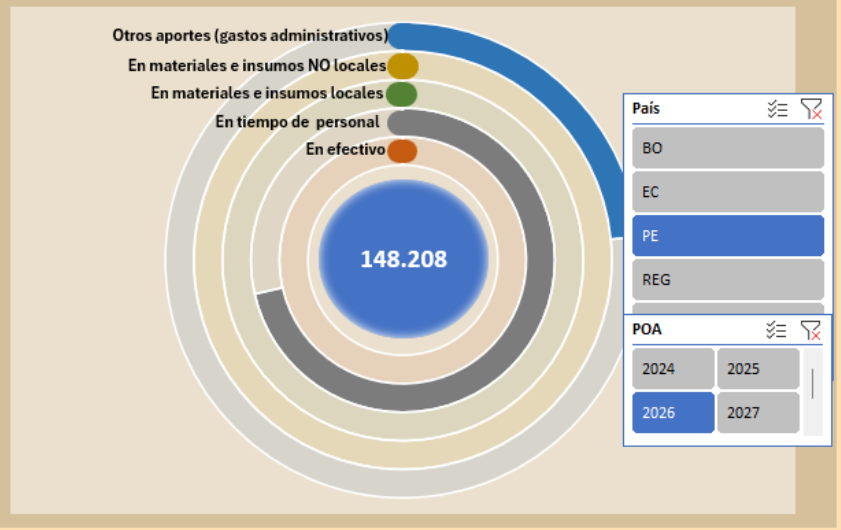

Contrapartida desagregada por socios (CHF)

Entidad	Contraparte
CMAC	CHF 9.650
MINAM	CHF 12.398
FONCODES	CHF 14.569
MIDAGRI	CHF 38.796
GORE	CHF 15.512
COMUNIDADES	CHF 37.752
IGP	CHF 3.820
UTEC	CHF 7.723
NOS	CHF 2.744
MUSA	CHF 5.244

Entidad	Contraparte

